

도 시 과

도시과 기본현황


□ 정원현황

(단위:명)

직급별	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	비고
정 원	13	1	3	3	4	1	1	
현 원	13	1	3	3	4	1	1	

※ 청원경찰 : 3명

□ 기 구

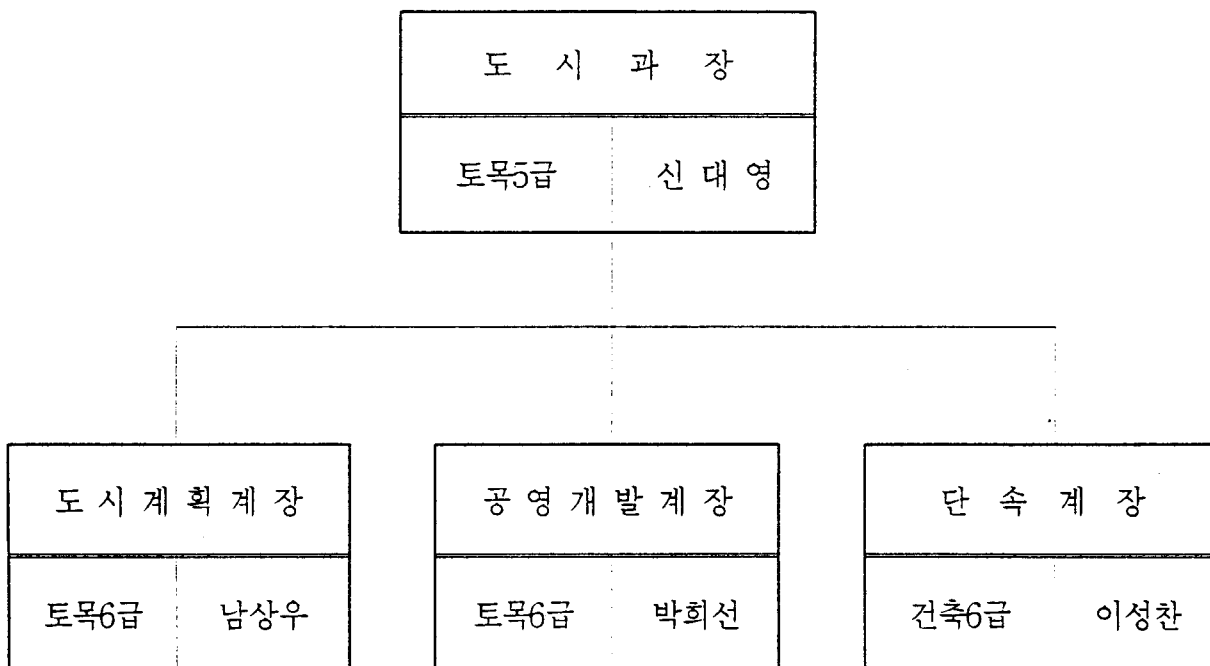

□ 택지개발·구획정리 추진 현황

사업명	위 치	면적(m ²)	사업비 (백만원)	수용가구·인구		착공 (예정)	준공 (예정)	사업주체
				가 구	인 구			
총 계		991,992	201,352	8,557	29,891			
토지구획 정리사업	가남리 광석리 석우리	182,861	11,738	589	2,003	'98년	2000.10	양주군
택지개발 (1지구)	덕정리 고암리	565,131	146,314	5,268	18,438	'97.5.6	2001.12	주택공사
택지개발 (2지구)	고암리	244,000	52,300	2,700	9,450	2000년	2003	주택공사

□ 토지이용계획 용도지역 지정 현황

(단위:km)

읍면별	총면적	도 시 계 획 구 역					준도시 지 역	군사시설 보호구역	개발제한 구 역	비 고
		소계	주거	상업	공업	녹지				
계	309.82	14.7 (4.8%)	1.58	0.09	0.16	12.87	7.916 (2.6%)	136.77 (45%)	79.02 (26%)	
회천읍	42.60	2.85	0.47	0.03	0.05	2.30	1.704	1.75	-	
주내면	43.11	-	-	-	-	-	2.634	8.36	27.60	
은현면	34.48	-	-	-	-	-	0.460	14.77	-	
남 면	36.68	5.40	0.38	0.03	0.06	4.94	0.267	34.50	-	
광적면	48.49	3.40	0.27	0.03	0.06	3.04	1.402	29.96	-	
백석면	41.40	3.05	0.46	-	-	2.59	0.363	8.79	5.18	
장흥면	63.06	-	-	-	-	-	1.086	38.64	46.24	

도시계획 재정비

□ 도시계획구역 지정 현황

도시명	면 적 (km ²)					최 초 지정일	최 근 재정비일	재정비 추진	비 고
	계	주거	상업	공업	녹지				
계	14.7	1.58	0.09	0.16	12.87				
회 천	2.85	0.47	0.03	0.05	2.30	'74.7.11	'87.6.8	재정비중	• '98.7월 공람 예정
남	5.40	0.38	0.03	0.05	4.94	'74.9.16	'97.1.31	-	• 2002년 재정비 착수 대상
광 적	3.40	0.27	0.03	0.06	3.04	'74.12.16	'87.5.27	재정비중 (군협의)	• '98년도 재정비 완료
백 석	3.05	0.46	-	-	2.59	"	'94.7.13	-	• '99년도 재정비 착수 대상

□ 도시계획 재정비 추진현황

1. 회천 도시계획 재정비

○ 사업개요

- 위 치 : 회천읍 덕정리 일원
- 사업규모 : 2.85km²
- 사업비 : 258,700천원(군비)
- 추진기간 : '97.4.1~'98.10월

○ 추진실적

- '97.4.1 : 도시계획 재정비 용역 계약
- '98.5월 : 경원선 전철복선화 계획에 따른 철도청 협의 및 재정비(안) 확정

○ 향후 추진계획

- '98. 7월 : 주민 공람 공고
- '98. 8월 : 경기도 도시계획위원회 상정 예정
- '98.10월 : 도시계획 재정비 변경 결정 고시

2. 광적 도시계획 재정비

○ 사업개요

- 위 치 : 광적면 가남리, 광석리, 석우리 일원
- 사업규모 : 3.972km²(기정 3.4km² 확장 0.572km²)
- 사업비 : 220백만원(군비)
- 최근 재정비 연월일 : '87.5.26
- 추진기간 : '95.5월~'98.8월

○ 추진실적

- '97.10월 : 주민 공람 공고 완료
- '97.11월 : 경기도 도시계획위원회 상정
- '98.1.14 : 경기도 도시계획위원회 소위원회 심의(조건부 의결)
- '98.6.9 : 농지전용 협의 완료(농림부)

○ 향후 추진계획

- '98.7월 : 군부대 협의 및 조건부 의결사항 재공람 공고
- '98.8월 : 광적 도시계획 재정비(변경) 결정 및 지적 고시

경원선 복선 전철화 역세권 개발구상 추진

□ 현 황

역 명	역 세 권 면 적 (m')					비 고
	계	상업	역사 및 철 도	공원 및 녹 지	광 장 주차장 등	
계	484,100	121,300	20,800	65,900	276,100	
양 주	143,000	-	8,000	41,500	93,500	
산 북	64,000	17,400	4,200	6,100	36,300	
덕 계	54,000	21,100	3,400	2,600	26,900	
회 정	104,000	35,500	1,700	9,200	57,600	
봉 양	119,100	47,300	3,500	6,500	61,800	

□ 개발내용 및 방법

- 역세권의 체계적 개발을 위한 토지이용계획(상업, 광장, 주차장, 녹지, 도로등) 마련
- 신설예정 역사주변 지역에 대하여 개발계획을 수립하여 법적근거를 마련하고 토지구획정리사업 또는 택지개발 사업 등 공영개발사업 시행하여 신설역사 기반조성

□ 추진실적

- '97.11.25 : 역세권 개발구상 용역 착수
- '98. 6.15 : 역세권 개발구상 용역 완료
- '98. 6.26 : 역세권 개발구상 용역결과 제출(철도건설본부)

□ 향후 추진계획

- '99. 2월 : 국토이용계획변경 용역 착수(준농림→준도시)
- '99. 6월 : 국토이용계획변경 용역 완료
- '99.10월 : 역세권 개발계획 확정

고읍 취락지구 개발계획 변경

(토지구획정리사업 연계 추진)

□ 사업개요

- 위 치 : 주내면 고읍, 만송리 일원
- 사업규모 : 535,000m²(기정 390,000m², 추가 145,000m²)
- 사 업 비 : 675,800천원(국토이용계획 변경 75,800, 구획정리 600,000)
- 추진기간 : '97.10.16~'99.6월

□ 추진실적

- '97.11월 : 취락지구 개발계획 변경 용역 착수
- '98. 3월 : 취락지구 개발계획 변경 용역 완료

□ 추진계획

- '98.9월 : 개발계획 변경 결정 고시
- '98.9월 : 토지구획정리사업 기본계획 및 조사설계 용역 발주(용역비 6억)
- '99.2월 : 토지구획정리사업 기본계획 및 조사설계 완료
- '99.6월 : 토지구획정리사업 시행 인가

□ 기대효과

- 준농림지역 난개발 억제를 위한 취락지구 확대지정을 통한 체계적개발
- 부족되는 학교 용지 및 공공시설용지 확보
- 토지 구획정리 사업을 위한 개발여건 조성
- 규모있는 주택단지 건설로 쾌적하고 계획성 있는 도시발전 도모

일영취락지구 지정 국토이용계획 변경 추진

□ 현 황

- 위 치 : 양주군 장흥면 일영리 일원
- 면 적 : 300,000m²
- 내 용 : 준농림(0.3km²) ⇒ 준도시 취락지구(0.3km²)
- 사업비 : 75,000천원(군비)

□ 추진실적

- '98.6월 : 국토이용계획 변경용역 설계 완료

□ 추진계획

- '98.10월 : 국토이용계획 변경 용역 실시
- '99. 2월 : 국토이용계획 변경에 따른 주민 공람 공고
- '99. 4월 : 국토이용계획 변경 결정

□ 문 제 점

- '98 하수처리 시설(7,000톤/일) 건립 계획 미반영(환경부)되어 환경성 검토시 하수처리 계획 미비로 취락지구 지정 애로 예상
- 현행 계획대로 지정 추진시 개발제한구역 실태조사 결과에 따라 취락지구 지정 대상 구역 조정 불가피

□ 대 책

- 소규모 하수처리시설 설치 사업 '98 계획 반영 지속 건의
- 하수처리시설에 대한 민자유치 대상 사업시행 방안 강구
- G.B 실태조사 결과 구역 조정 내용을 반영하여 지정대상 결정 추진

가남지구 토지구획정리사업

□ 사업개요

- 위 치 : 광적면 가남리, 광석리, 석우리 일원
- 사업규모 : 188,454m²(57,007평)
- 추진기간 : '96.1월~2001.12월
- 사 업 비 : 12,351백만원

(단위:백만원)

총사업비	기투자	'98 사 업 비					향후 투자	비고
		계	국비	도비	군 비	기타		
12,351	285	4,107				4,107	8,244	

□ 추진실적

- '97. 5월 : 도시계획(가남지구 토지구획 정리사업) 변경 결정 승인
- '97. 9월 : 사업시행 인가에 따른 공람 공고
- '97.12월 : 사업시행 인가
- '97.12월 : 실시설계 완료
- '98. 2월 : 공사 발주
- '98. 5월 : 환지예정지 공람 공고
- '98. 6월 : 시공업체 선정
- '98. 6월 : 전면책임감리 업체 선정 및 공사착공

□ 이후 추진계획

- '98. 7월 : 환지 계획 인가 신청
- '98. 8월 : 사업지구 경계 및 도로교차점 말박기 측량 시행
- '98. 8월 : 지장물 철거 감정 평가
- '98. 9월 : 환지계획 공고 및 관계인 통보
(환지 예정지 증명발굴, 측량 대행업 지정)
- '98. 9월 : 체비지 매각 처분에 대한 토지감정 의뢰 및 지장물 철거대상
관계자 통보
- '98.10월 : 체비지 공개입찰 실시
- 2001.12월 : 공사 준공

남면 도시계획도로 개설공사

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 남면 신산리 일원(25사단 후문, 장마당, 남면상고 앞)
- 사업규모 : L=1,590m, B=6~10m
- 추진기간 : '98.2월~2000.12월
- 사 업 비 : 6,000백만원(도비 3,600백만원, 군비 2,400백만원)
※ '98 확보액 685백만원('98군비 미부담액 315백만원)

(단위:백만원)

총사업비	기투자	'98 사 업 비					향후 투자	비고
		계	국비	도비	군 비	기타		
6,000	-	685		600	85		5,315	

□ 추진실적

- '98.1월 : 토지분할 측량
- '98.1월 : 실시설계 발주
- '98.3월 : 실시설계 착공
- '98.6월 : 실시설계 준공

□ 추진계획

- '98.7월 : 주민 설명회 개최
- '98.7월 : 감정 평가 실시
- '98.8월 : 편입토지 및 지장물 용지보상 실시

□ 기대효과

- 사유재산권 침해 해소 및 주민 편의 증진
- 학생 통학로 및 출퇴근 차량 도로협소로 교통불편 해소
- 기존도로(지방도 323호)와 연결 우회도로 개설로 신산리의 교통체증해소

광적 도시계획도로 개설공사

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 광적면 가남리(조양중학교옆~가남리 우회도로 연결)
- 사업규모 : L=834m, B=15m
- 사업기간 : '96.3월~'98.10월
- 사 업 비 : 3,000백만원

(단위:백만원)

총사업비	기투자	'98 사 업 비					향후 투자	비고
		계	국비	도비	군 비	기타		
3,000	1,199	1,801		1,020	781			

□ 추진실적

- '96. 4월 : 실시설계 완료
- '96.11월 : 인가 신청
- '96.12월 : 용지보상 협의 통지
- '97. 5월 : 공사 착공
- '97.12월 : 동절기 공사 중지
- '98. 3월 : 재 착공
- '98. 4월 : 시공회사의 부도로 정산준공(협성종합건설의 부도로 공사포기)

□ 추진계획

- '98. 6월 : 시공보증회사와 재계약(주식회사 금산종합건설과 재계약)
- '98. 7월 : 1차 준공(토공, 구조물, 하수공)
- '98. 7월 : 2차 착공(포장공, 광장개설, 부대공)
- '98.10월 : 준공

□ 기대효과

- 사유재산권 침해 해소 및 주민 편익 증진
- 도시개발 시설 확충 정비로 도시미관 및 주민복지 향상 기여

백석도시계획도로 개설공사

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 백석면 방성리·오산리(26사단앞~백석농협앞)
- 사업규모 : L=1,638m, B=20m
- 사업기간 : '97.2월~'99.12월
- 사 업 비 : 6,100백만원(도비 : 3660백만원, 군비 : 2440백만원)

(단위:백만원)

총사업비	기투자	'98 사 업 비					향후 투자	비고
		계	국비	도비	군 비	기타		
6,100	664	1,769		1,102	667		3,667	

□ 추진실적

- '97. 3월 : 분할측량
- '97. 6월 : 실시설계 완료
- '97. 11월 : 감정평가 완료 및 편입용지 보상실시(총134건중 117건완료)

□ 추진계획

- '99.3월 : 공사 착공

□ 문제점 및 대책

- '97년도 확보 사업비 1,100백만원과 '98년도 확보 1,333백만원(합계 2,433백만원)으로 우선 편입용지 보상실시
- '97~'98년 본예산 확보액으로는 공사발주가 어려운 실정으로 추경시 도비 지원을 요청

덕계 취락지 가로망 정비사업

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 회천읍 덕계리(전원마을)
- 사업규모 : L=610m, B=6~10m
- 추진기간 : '98.4월~'98.12월
- 사 업 비 : 2,600백만원

(단위:백만원)

총사업비	기투자 (양여금)	'98 사 업 비					향후 투자	비고
		계	국비	도비	군 비 (양여금)	기타		
2,600	893	650			650		1,057	

□ 추진실적

- '98. 3월 : 덕계출장소~안골슈퍼간(150m) 실시설계 완료
- '98. 3월 : 덕계리 가로망 정비사업 집행 의뢰
- '98. 4월 : 용지보상 추진중
- '98. 4월 : 공사착공
- '98. 6월 : 공사중지

□ 추진계획

- '99. 7월 : 재착공
- '99.12월 : 준공예정

□ 문제점 및 대책

- 전원마을 구간 사업비 1,057백만원(공사비 450, 보상비 607) 부족으로 사업추진지연
- 가로망 정비사업 구간내 대성전선 공장이 편입되어 당초 '98.6월말까지 총 북으로 이전 완료 계획이었으나 IMF 한파로 공장이전이 지연되고,
- 당초 설계시 공장이전을 감안하여 가시설물(흙막이공)을 계상치 않았으나 이전이 지연되므로 추가 공사비(60백만원) 투입이 불가피함에 따라 공장 이전후('99.6월) 사업 착공코저 함.

선암 취락지 가로망 정비사업

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 은현면 선암리(면사무소앞)
- 사업규모 : L=315m, B=10m
- 추진기간 : '95.3~98.12월
- 사 업 비 : 520백만원(보상비 220백만원, 공사비 300백만원)

(단위:백만원)

총사업비	기투자	'98 사 업 비					향후투자	비고
		계	국비	도비	군 비	기타		
520	220	300			300			

□ 추진실적

- '95. 1월 : 실시설계 용역 완료
- '95. 3월~'96.12월 : 용지 보상
- '98. 3. 23 : 선암리 가로망 정비사업 입찰(덕성토건)
- '98. 4월 : 공사 착공

□ 추진계획

- '98.12월 : 완료예정

□ 문 제 점

- 집중 호우시 배수시설에 대한 민원제기로 공사 지연

□ 대 책

- 주민 의견을 반영하여 배수시설에 대한 설계변경 및 시공으로 민원해소

상수 취락지 가로망 정비사업

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 남면 상수리 취락지구내
- 사업규모 : L=950m, B=15m
- 추진기간 : '97.1~'98.12월
- 사 업 비 : 1,218백만원

(단위:백만원)

총사업비	기투자	'98 사 업 비					향후투자	비고
		계	국비	도비	군 비	기타		
1,218	418	300			300		500	

□ 추진실적

- '97.3.20 : 실시 설계 용역 완료
- '97.6월 : 용지보상 협의(총 62건중 51필지 82%)
- '98.4월 : 공사 착공

□ 추진계획

- '98.12월 : 준공 예정

□ 문 제 점

- 공사비 8억 확보하여 사업완료하여야 하나 군 재정형편상 3억원만 확보하여 사업 마무리 차질

□ 대책 및 건의

- 부족 사업비 500백만원을 '98. 3회 추경예산에 확보하여 마무리토록 사업비 지원 건의

하수도 정비사업

□ 사업개요

- 위 치 : 양주군 일원
- 사업량 : 하수도 신설 L=2.0km(도시 및 농촌하수도)
- 추진기간 : '98.1월~'98.12월
- 사업비 : 460백만원('98사업비)

(단위:백만원)

총사업비	기투자	'98 사업비					향후투자	비고
		계	국비 (양여금)	도비	군비	기타		
1,924	906	460	392		68		558	

□ 추진실적

- '98.1월 : '98 사업 대상지 선정
 - 울정하수도 L=181m • 유양하수도 L=244m • 봉암하수도 L=250m
 - 부곡하수도 L=117m • 남면하수도 L= 80m • 광석하수도 L=185m
 - 연곡하수도 L= 49m • 오산하수도 L=230m • 덕정하수도 L= 80m
- '98.3월 : 실시설계 용역 착수
- '98.5월 : 실시설계 용역 완료
- '98.6월 : 공사 착공

□ 추진계획

- '98.12월 : 공사 완공

□ 기대효과

- 불량 하수도를 정비하여 위생적 하수처리를 통한 주거 환경 개선

차집관로 매설

□ 사업개요

- 위 치 : 신천 수계 8개 하천(L=48.3km)
 - 1단계(28.3km) : 신천(17.3), 청담천(8.2), 덕계천(1.8), 효촌천(1.0)
 - 2단계(20km) : 신천(3.0), 회암천(9.0), 입암천(5.0), 석우천(2.0), 우고천(1.0)
- 사 업 비

(단위:백만원)

총사업비	기투자	'98 사 업 비					향후투자	비고
		계	국비	도비	군 비	기타		
17,646	10,502	5,581	2,986	1,298	1,297		1,563	

□ 추진실적

구 분	총사업량	'96까지	'97.실적	'98계획	'98이후	추진진도 ('97까지)
소 계	48.3km	17.3	7.1	19.2	4.7	51%
1단계	28.3	17.3	7.0	4.0	-	86%
2단계	20	-	0.1	15.2	4.7	1%

□ 추진계획

- 위 치 : 백석면 복지리~남면 경신리
- 사 업 량 : L=19.2km('97이월 5.0km, '98 신규 14.2km)
- 추진일정
 - '98. 4월 : 공사 착공
 - '99. 3월 : 공사 준공

□ 문 제 점

- 차집관로, 하천개수, 하천 정화사업이 병행시공되어 개수공사에 편입되는 사유지의 보상 협의 불응으로 공사 기간 지연 초래
- 주 관로와 연결되는 2차 차집시설이 별도 군비를 확보하여 시공토록 설계되어 시공이 완료된 관로의 훼손이 불가피하여 시공상 문제 발생
- 양여금 삭감으로 '98 신규 사업물량(14.2km) 축소시공 불가피(6.4km)

□ 대책 및 건의

- 유관 공사와 상호 협조하여 해결 방안 모색
- 2차 차집 시설에 대하여 동두천시와 협의하여 주 관로와 일괄 시공 추진

남면 소규모 하수처리장 건설

□ 사업개요

- 위 치 : 남면 입암리(입암천)
- 사업규모 : 시설용량 5,000톤/일, 부지면적 16,500m², 차집관거 3.0km
- 추진기간 : '97~2000년
- 사 업 비 : 15,000백만원

(단위:백만원)

총사업비	기투자	'98 사 업 비					향후투자	비고
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		
15,000	602	7,200	5,040	1,080	1,080		7,198	

※ '98사업비 7,200백만원 미확보

□ 추진실적

- '97. 6월 : 기본 및 실시설계 발주
- '97. 7월 : 실시설계 용역 및 하수도정비 기본계획 변경 용역 착수
- ※ '97.9.26 : 환경부 방문 → '98 사업비 지원 건의

□ 추진계획

- '98. 7월 : 하수도 기본계획 인가신청 및 기술자문위원회 상정
- '98.10월 : 실시설계용역 및 하수도정비 기본계획 변경 완료
- '98.10월 : 용지 보상(하수처리장 부지)
- '99. 3월 : 공사 착공

□ 문제점 및 대책

- '98 소요사업비 72억 미확 보(양여금 50억 미 지원시 사업추진 곤란)
- 지속적인 사업비 지원 건의 및 민자유치 등 다각적인 시행 방안 강구

남면 신암리 자연환경보전지역 해제

□ 현 황

- 위 치 : 양주군 남 면 신암리 일원
- 면 적 : 1.051km²(318천평)
 - 상수원보호구역 지정 : 0.538km²(163천평)
- 내 용 : 자연환경보전지역(1.051km²) → 준농림지역(1.051km²)

□ 그간 추진실적

- '93.3.5 : 상수원 보호구역 축소 조정(1.051km² → 0.538km²)
- '98.3.6 : 상수원보호구역 해제(0.564km²)

□ 추진계획

- '98. 8월 : 국토이용계획 변경 용역 착수
- '98.11월 : 국토이용계획 변경 용역 완료
- '98.12월 : 국토이용계획 변경 결정 고시 요청(경기도)
- '99. 3월 : 국토이용계획 변경 결정 고시(경기도)

□ 문 제 점

- 국토이용관리법에 의한 토지 수급 물량이 건설교통부에서 미 배정되어 국토이용계획 변경 곤란
 - ※ '97.10.28 토지수급계획 물량 배정 요청 (1.051km²) → 경기도

□ 대 책

- 토지 수급 물량 배정 지속 건의(경기도)
- 토지 수급 물량 확정 후 국토이용계획 변경 결정 추진

송추집단시설지구내 도로정비사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 양주군 장흥면 울대리 일원
- 사업규모 : L=1.1km, B=4.0m
- 추진기간 : '97.7월~'98.12.30
- 사 업 비 : 250백만원(도비)

(단위:백만원)

총사업비	기투자	'98 사 업 비					향후투자	비고
		계	국비	도비	군 비	기타		
250	133	117		117				

☐ 추진실적

- '97. 7.30 : 사업착수
- '97.12.13 : 사업중지(민원발생 및 기온의 급강하)
- '98. 3월 : 사업 재착수

☐ 추진계획

- '98.12월 : 사업완료 예정

☐ 문 제 점

- 송추집단시설 지구내 탐방도로 사업구간내 주민의 민원 관계로 총 사업 구간 1.1km중 906m 사업완료 구간에 대하여 준공
- 잔여구간 188m 구간은 민원 해결시 추후 공사 발주 예정

☐ 대책 및 건의

- 송추유원지 번영회 및 주민과의 원만한 협의를 거쳐 사업추진 완료

‘98 개발제한구역 관리

□ 개발제한구역 현황

○ 면 적 : 79.02km²(주내 27.60km², 백석 5.18km², 장흥 46.24km²)

□ 방 침

- 정기적 구역 순찰확행으로 불법행위 사전 예방단속 강화
- 취약지역 및 시설물 관리대장 작성 특별 관리
- 불법행위 발생시 계고 및 충분한 설명으로 민원 발생억제
- 홍보활동 강화 및 주민계도로 불법행위 사전 예방
- 불합리한 규제사항 건의 및 개정

□ 그간 추진실적

○ G.B 전수 실태 조사

- 목 적 : 신정부 100대 국정지표중 하나인 「개발제한구역합리적조정」과 관련하여 기초자료를 수집 반영 추진
- 조사기간 : '98.5.26~6.30
- 조사대상 : 개발제한구역내의 전필지를 대상으로 26개 항목 전수조사
- 조사결과

구 분	필지수	면적(m ²)	인 구 수		건축물동수	비고
			세대수	세대원수		
계	17,386	72,408,750	2,286	6,883	5,443	
주 내 면	8,521	25,403,161	1,281	3,855	2,692	
백 석 면	619	6,943,401	44	134	17	
장 흥 면	8,246	40,062,188	961	2,894	2,627	

- 향후 추진계획
 - 토지공사 전산입력 작업결과 확인 수정 제출
 - 건설교통부 현장조사 실시('98.7월중)
 - 불합리한 사항 제도개선 요구

○ G·B 항공 측량 판독 조사 실시

- 조사대상 : 1,168건(268건은 천성농원 유보대상임)
- 신 측 : 507건
- 중 측 : 89건
- 중·개측 : 255건
- 개 측 : 8건
- 형질변경 : 309건

○ G·B 불법 행위 단속

- 군 : 월 2회 정기적인 구역 순찰 및 점검 실시
- 면 : 담당자로 하여금 1일 순찰 실시

○ G·B내 담당자 교육 실시

- 매월 1회이상 교육 실시
- 사안 발생시 수시 교육

○ 기타 G·B내 각종 인·허가 및 사후관리 실시

□ 향후 단속계획

- G·B내 구역 보존의지를 가지고 관리 철저
- 위법 행위 발생시 즉시 원상복구 실시
- 정기적인 교육 실시
